

说 明

- 1、审查意见有经省建设厅考核认定的施工图审查人员认真填写，并签字、盖章。
- 2、审查结论由施工图审查机构负责人认真填写，并签字、盖章。
- 3、本《审查报告》系该工程项目施工图设计文件交付使用的法律凭证。
- 4、本《审查报告》一式三份，由建设单位（业主）、施工图审查机构和分管的建设行政主管部门各执一份。

江西省工程勘察审查报告

编号: JJS-2018-K28031

建设项目名称	湖口县中医院康复住院大楼	投资额	万元	工程量	
建设地点	湖口县	设计规模			
建设单位名称	湖口县中医院	项目负责人			
勘察单位名称	九江市建筑设计院	项目负责人		梁晓英	
资质等级	乙级	证书编号		B236003103	

- 1、勘察报告提供的数据是否真实可靠;
- 2、报建手续是否齐全;
- 3、是否按规定盖有出图章和签署, 资质与项目规模是否匹配;
- 4、工程基础(含软基)处理是否安全、可靠。
(宏观、大的方面的审查)

审查意见


- 1、报建手续齐全;
- 2、项目规模与勘察单位资质匹配, 图章及签字符合规定;
- 3、勘察报告资料齐全, 地基设计参数恰当;
- 4、基础方案建议合理。



是否符合有关工程强制性标准规范（违反强标方面的审查）

审查意见


符合



按照建设部和省里的岩土工程勘察报告审查要点的审查

审查意见

根据初审意见进行修改和回复后，基本满足规范要求。



2018年4月10日

施工图审查机构综合结论

合格

负责人签字:

审查机构（盖章）




2018年4月10日

备 注

是否符合有关工程强制性标准规范（违反强标方面的审查）

审查意见


符合



按照建设部和省里的岩土工程勘察报告审查要点的审查

审查意见

根据初审意见进行修改和回复后，基本满足规范要求。



2018年6月10日

施工图审查机构综合结论

合格

负责人签字:

审查机构（盖章）



2018年6月10日

备 注

标准贯入试验统计表

工程名称：湖口县中医院住院大楼

共1页 第1页

序号	层号	土层名称	孔号	试验次数	起止深度	实测击数	杆长	修正击数	修正计算值N	承载力特征值 kpa
1			ZK1		7.70-8.00	11.0	10.00	9.3		
2			ZK2		6.30-6.60	9.0	9.00	7.7		
3			ZK4		3.00-3.30	9.0	6.00	8.3		
4			ZK6		6.90-7.20	10.0	9.00	8.6		
5			ZK9		9.50-9.80	10.0	12.00	8.1		
6	②	黄褐色粉质粘土	ZK12	6	4.80-5.10	9.0	7.00	8.1	7.0	130
1			ZK4		16.30-16.60	18.0	19.00	13.0		
2			ZK6		20.00-20.30	19.0	22.00	13.6		
3			ZK7		22.90-23.20	19.0	25.00	13.3		
4			ZK8		17.20-17.50	18.0	19.00	13.0		
5			ZK11		21.60-21.90	19.0	24.00	13.3		
6	③	黄色粉质粘土	ZK12	6	17.80-18.10	17.0	20.00	12.1	12.0	160


勘察单位：九江市建筑设计院

制表：刘慧君

校对：刘小凤

建筑物与勘探点平面布置图

比例尺 1:700

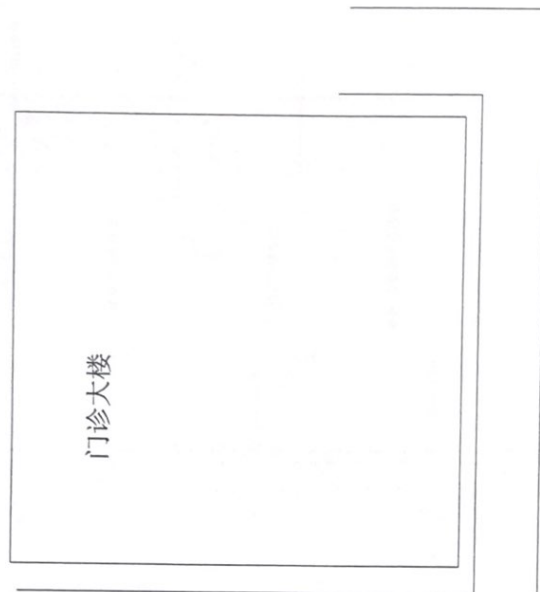

江西省勘察文件审查专项
审查合格专用章
审查单位:江西省建筑设计审查中心
认定类型:丁类住宅
有效期至:2019年12月
江西省住房和城乡建设厅核发
编号: S14316




九江市建筑设计院	湖口县中医院住院大楼	项目负责人	刘慧君	制图	审核	刘慧君
----------	------------	-------	-----	----	----	-----

工程地质剖面图


水平 1:300 垂直 1:350

1-----1'

高程 (m)
(相对高程)

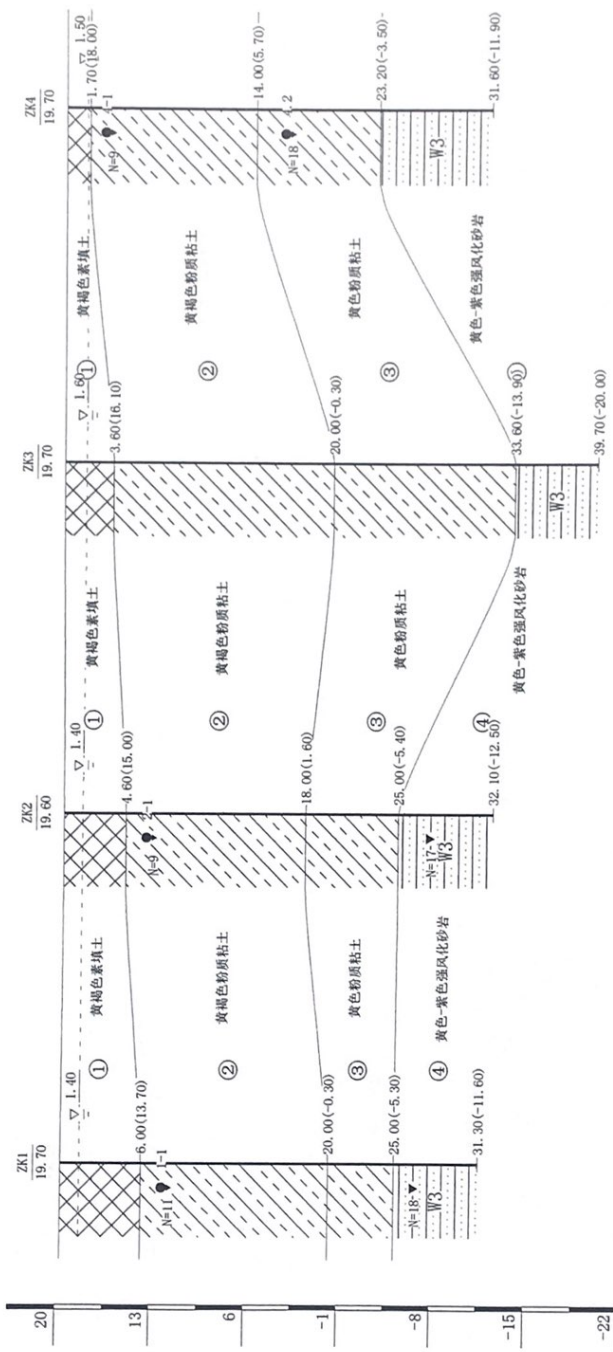

钻孔深度 (m)	31.30	32.10	39.70	31.60
钻孔间距 (m)	22.00	22.00	22.00	




工程地质剖面图

水平 1:300 垂直 1:350


2-----2'

高程(m)
(相对高程)

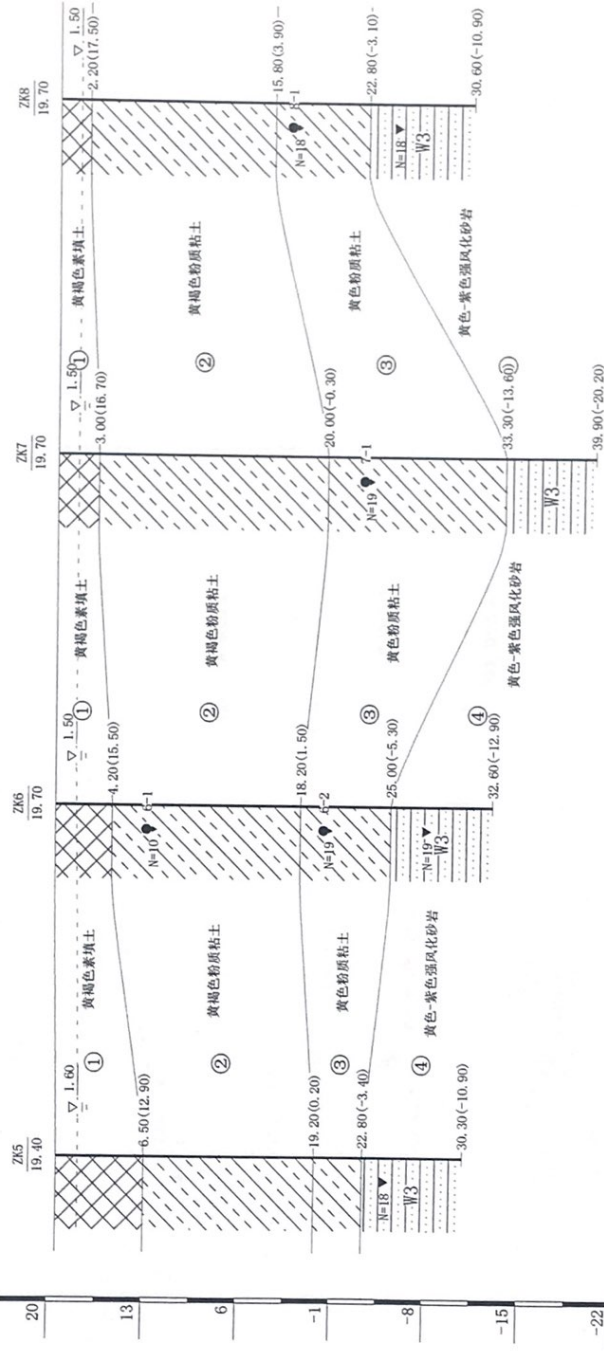

钻孔深度(m)	30.30	32.60	39.90	30.60
钻孔间距(m)	22.00	22.00	22.00	

图例



九江市建筑设计院

湖口县中医院住院大楼

项目负责人

刘慧君

制图

审核


刘慧君

工程地质剖面图

水平 1:300 垂直 1:350

3-----3'

高程(m)
(相对高程)

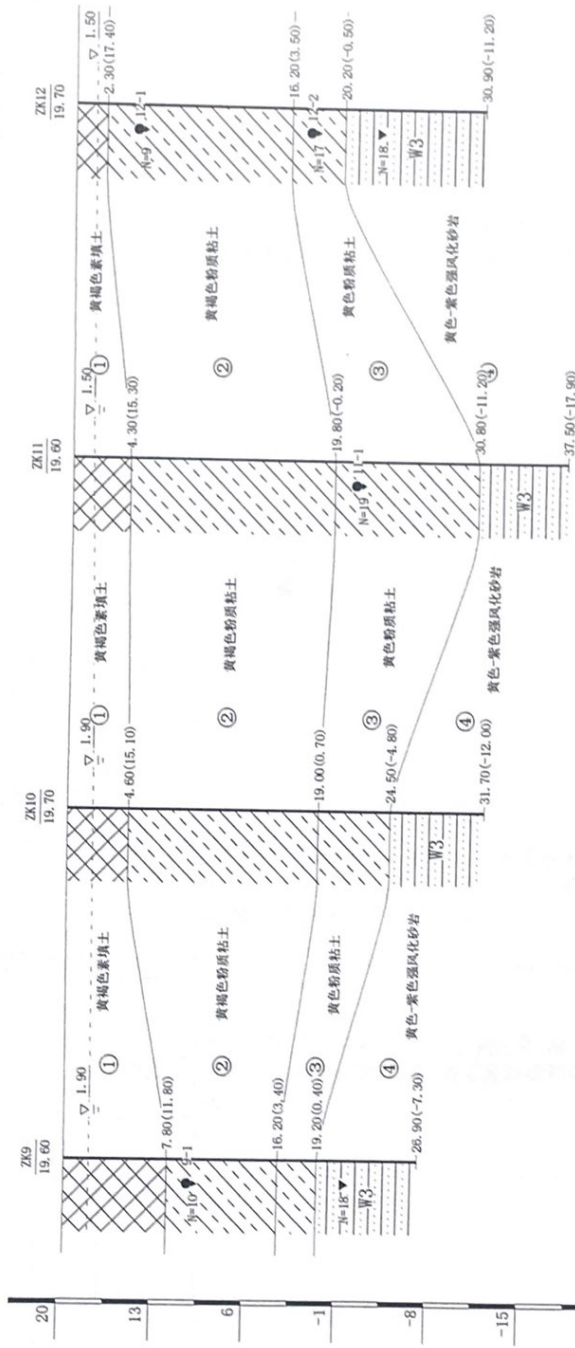

图例



九江市建筑设计院

湖口县中医院住院大楼

项目负责人

刘慧君

制图

审核

刘慧君

钻孔柱状图

共 1 页 第 1 页

工程名称		湖口县中医院住院大楼				勘察单位	九江市建筑设计院					
钻孔编号		ZK1		钻孔深度		31.30		m	孔口标高	19.70		m
坐标		X: 3327000.00		m	初见水位		1.80		m	开孔日期	2018年02月03日	
		Y: 462400.00		m	稳定水位		1.40		m	终孔日期	2018年02月03日	
地及 质成 时因 代	层 序	层 底 标 高 (m)	层 底 深 度 (m)	分 层 厚 度 (m)	柱 状 图 1:200	岩 土 描 述				原位测试	取 样	
										击 数	取样编号	
										深 度(m)	深 度(m)	
Q ^{ml}	①	13.70	6.00	6.00		黄褐色素填土: 黄褐色, 主要为粉质粘土, 中间夹有风化石, 孔隙发育, 压缩性较大, 回填时间较短在2年左右, 未完成自重固结, 松散状。				11(9.3) 7.70-8.00	1-1 7.20-7.40	
Q ^{dl+pl} ₄	②	-0.30	20.00	14.00		黄褐色粉质粘土: 可塑状, 中等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿。						
Q ^{dl+pl} ₃	③	-5.30	25.00	5.00		黄色粉质粘土: 可塑-硬塑状, 中偏低等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿, 中间夹有黑色锰质薄膜。						
P	④	-11.60	31.30	6.30		黄色-紫色强风化砂岩: 黄色-紫红色, 湿, 粉砂结构, 层状构造, 岩体破碎, 岩芯呈块状和短柱状。.						
										18(12.4) 26.20-26.30		

▼标贯位置

■岩样位置

●原状土样位置

○扰动土样位置

凸水样位置

项目负责人:

李平

核对: 刘慧君

审核:

田

图号:

1

钻孔柱状图

共 1 页 第 1 页

工程名称		湖口县中医院住院大楼				勘察单位	九江市建筑设计院						
钻孔编号		ZK2		钻孔深度		32.10		m	孔口标高	19.60		m	
坐标		X: 3327022.00		m	初见水位		2.00		m	开孔日期		2018年02月03日	
		Y: 462400.00		m	稳定水位		1.40		m	终孔日期		2018年02月03日	
地及 质成 时因 代	层 序	层底 标高 (m)	层底 深度 (m)	分层 厚度 (m)	柱状图 1:200	岩 土 描 述			原位测试		取 样		
									击 数		取样编号		
									深 度(m)		深 度(m)		
Q ^{ml}	①	15.00	4.60	4.60		黄褐色素填土: 黄褐色, 主要为粉质粘土, 中间夹有风化石, 孔隙发育, 压缩性较大, 回填时间较短在2年左右, 未完成自重固结, 松散状。			9(7.7) 6.30-6.60		2-1 5.80-6.00		
Q ^{dl+pl} ₄	②	1.60	18.00	13.40		黄褐色粉质粘土: 黄褐色, 可塑状, 中等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿。							
Q ^{dl+pl} ₃	③	-5.40	25.00	7.00		黄色粉质粘土: 黄褐色-黄色, 可塑-硬塑状, 中偏低等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿, 中间夹有黑色锰质薄膜。							
P	④	-12.50	32.10	7.10		黄色-紫色强风化砂岩: 黄色-紫红色, 湿, 粉砂结构, 层状构造, 岩体破碎, 岩芯呈块状和短柱状。							
									17(11.6) 27.10-27.40				

▼标贯位置

■岩样位置

●原状土样位置

○扰动土样位置

凸水样位置

项目负责人:

刘慧君

核对: 刘慧君

审核:

图号: 2

钻孔柱状图

共 1 页 第 1 页

工程名称		湖口县中医院住院大楼				勘察单位	九江市建筑设计院				
钻孔编号		ZK2		钻孔深度		32.10 m		孔口标高		19.60 m	
坐标		X: 3327022.00 m		初见水位		2.00 m		开孔日期		2018年02月03日	
		Y: 462400.00 m		稳定水位		1.40 m		终孔日期		2018年02月03日	
地及质成时因代	层序	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:200	岩 土 描 述				原位测试	取 样
										击 数	取样编号
										深 度(m)	深 度(m)
Q ^{ml}	①	15.00	4.60	4.60		黄褐色素填土: 黄褐色, 主要为粉质粘土, 中间夹有风化石, 孔隙发育, 压缩性较大, 回填时间较短在2年左右, 未完成自重固结, 松散状。				9(7.7) 6.30-6.60	2-1 5.80-6.00
Q ^{dl+pl} ₄	②	1.60	18.00	13.40		黄褐色粉质粘土: 黄褐色, 可塑状, 中等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿。					
Q ^{dl+pl} ₃	③	-5.40	25.00	7.00		黄色粉质粘土: 黄褐色-黄色, 可塑-硬塑状, 中偏低等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿, 中间夹有黑色锰质薄膜。					
P	④	-12.50	32.10	7.10		黄色-紫色强风化砂岩: 黄色-紫红色, 湿, 粉砂结构, 层状构造, 岩体破碎, 岩芯呈块状和短柱状。。					
										17(11.6) 27.10-27.40	

▼标贯位置

■岩样位置

●原状土样位置

○扰动土样位置

凸水样位置

项目负责人:

刘慧君

核对: 刘慧君

审核:

刘慧君

图号:

2

钻孔柱状图

共 1 页 第 1 页

工程名称		湖口县中医院住院大楼				勘察单位		九江市建筑设计院				
钻孔编号		ZK3		钻孔深度		39.70 m		孔口标高		19.70 m		
坐标	X: 3327044.00 m		初见水位		1.90 m		开孔日期		2018年02月03日			
	Y: 462400.00 m		稳定水位		1.60 m		终孔日期		2018年02月03日			
地及质成时因代	层序	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:200	岩 土 描 述			原位测试		取 样	
									击 数		取样编号	
									深 度(m)		深 度(m)	
Q ^{ml}	①	16.10	3.60	3.60		黄褐色素填土: 黄褐色, 主要为粉质粘土, 中间夹有风化石, 孔隙发育, 压缩性较大, 回填时间较短在2年左右, 未完成自重固结, 松散状。						
Q ^{dl+pl} ₄	②	-0.30	20.00	16.40		黄褐色粉质粘土: 黄褐色, 可塑状, 中等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿。						
Q ^{dl+pl} ₃	③	-13.90	33.60	13.60		黄色粉质粘土: 黄褐色-黄色, 可塑-硬塑状, 中偏低等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿, 中间夹有黑色锰质薄膜。						
P	④	-20.00	39.70	6.10		黄色-紫色强风化砂岩: 黄色-紫红色, 湿, 粉砂结构, 层状构造, 岩体破碎, 岩芯呈块状和短柱状。。						

▼标贯位置

■岩样位置

●原状土样位置

○扰动土样位置

凸水样位置

项目负责人:

刘慧君

核对: 刘慧君

审核:








刘慧君

图号:

3

钻孔柱状图

共 1 页 第 1 页

工程名称		湖口县中医院住院大楼				勘察单位	九江市建筑设计院				
钻孔编号		ZK4		钻孔深度		31.60 m		孔口标高		19.70 m	
坐标		X: 3327066.00 m		初见水位		2.00 m		开孔日期		2018年02月04日	
		Y: 462400.00 m		稳定水位		1.50 m		终孔日期		2018年02月0日	
地及质成时因代	层序	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:200	岩 土 描 述			原位测试	取 样	
									击 数	取样编号	
									深 度(m)	深 度(m)	
Q ^{ml}	①	18.00	1.70	1.70		黄褐色素填土: 黄褐色, 主要为粉质粘土, 中间夹有风化石, 孔隙发育, 压缩性较大, 回填时间较短在2年左右, 未完成自重固结, 松散状。			9(8.3) 3.00-3.30	4-1 2.50-2.70	
						黄褐色粉质粘土: 黄褐色, 可塑状, 中等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿。					
Q ^{dl+pl} ₄	②	5.70	14.00	12.30							
						黄色粉质粘土: 黄褐色-黄色, 可塑-硬塑状, 中偏低等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿, 中间夹有黑色锰质薄膜。					
Q ^{dl+pl} ₃	③	-3.50	23.20	9.20					18(13.0) 16.30-16.60	4.2 15.80-16.00	
											
											
P	④	-11.90	31.60	8.40		黄色-紫色强风化砂岩: 黄色-紫红色, 湿, 粉砂结构, 层状构造, 岩体破碎, 岩芯呈块状和短柱状。					
											

▼标贯位置

■岩样位置

●原状土样位置

○扰动土样位置

▽水样位置

项目负责人:

刘慧君

核对: 刘慧君

审核:

刘慧君

图号:

4

钻孔柱状图

共 1 页 第 1 页

工程名称		湖口县中医院住院大楼				勘察单位	九江市建筑设计院					
钻孔编号		ZK5		钻孔深度		30.30		m	孔口标高	19.40		m
坐标		X: 3327000.00		m	初见水位		1.90		m	开孔日期	2018年02月04日	
		Y: 462415.00		m	稳定水位		1.60		m	终孔日期	2018年02月04日	
地及 质成 时因 代	层 序	层 底 标 高 (m)	层 底 深 度 (m)	分 层 厚 度 (m)	柱 状 图 1:200	岩 土 描 述				原位测试	取 样	
										击 数	取样编号	
										深 度 (m)	深 度 (m)	
Q ^{ml}	①	12.90	6.50	6.50		黄褐色素填土: 黄褐色, 主要为粉质粘土, 中间夹有风化石, 孔隙发育, 压缩性较大, 回填时间较短在2年左右, 未完成自重固结, 松散状。				18(12.2) 24.20-24.30		
Q ^{dl+pl} ₄	②	0.20	19.20	12.70		黄褐色粉质粘土: 灰褐色-黄褐色, 可塑状, 中等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿。						
Q ^{dl+pl} ₃	③	-3.40	22.80	3.60		黄色粉质粘土: 黄褐色-黄色, 可塑-硬塑状, 中偏低等压缩性, 切面光滑, 无摇震反应, 中等韧性, 干强度中等, 湿, 中间夹有黑色锰质薄膜。						
P	④	-10.90	30.30	7.50		黄色-紫色强风化砂岩: 黄色-紫红色, 湿, 粉砂结构, 层状构造, 岩体破碎, 岩芯呈块状和短柱状。						

▼ 标贯位置

■ 岩样位置

● 原状土样位置

○ 扰动土样位置

凸 水样位置

项目负责人:

刘慧君

核对: 刘慧君

审核:

刘慧君

图号:

5
